

Overzicht saneringswerken 3M site en omgeving Q1 2025

Te verwachten milestones voor het eerste kwartaal 2025

Verdere details vindt u door hieronder te klikken

- [Sanering grondwater op de site – in uitvoering](#)
- [Sanering zone nieuwe waterzuiveringsinstallatie – in uitvoering](#)
- [Sanering zone 1A – in uitvoering](#)
- [Sanering verdere woongebied – in voorbereiding](#)
- [Sanering Palingbeek – start februari 2025](#)

Alle tijdsindicaties in dit document zijn inschattingen gebaseerd op de meest actuele informatie aan het begin van het kwartaal. Deze kunnen doorheen de werken veranderen.

Sanering grondwater op de site

[Terug naar het overzicht](#)

Wanneer te verwachten: In uitvoering sinds 2010

- **Onderdeel van BSP:** Eerste gefaseerde BSP on site (2008); kleine wijziging op het BSP van 2008 (2022); gefaseerde BSP on site (2024); en BSP Kefalonia WZI (2025)
- **Locatie:** 3M site in Zwijndrecht
- **Doel:**
 - Het tegengaan van verdere verspreiding middels een hydraulische barrière aan de zuidkant van de site en het verwijderen van PFAS in de bronzones op de site
- **Belangrijke momenten:**
 - Start opzetten Pump and Treat system
 - Aanleg tijdelijke waterzuiveringsinstallatie
 - Aanleg hydraulische barriere
 - Uitbreiden van de hydraulische barriere:
 - Bouw nieuwe waterzuiveringsinstallatie

Status:


Voltooid

Voltooid

Voltooid

In voorbereiding

In voorbereiding

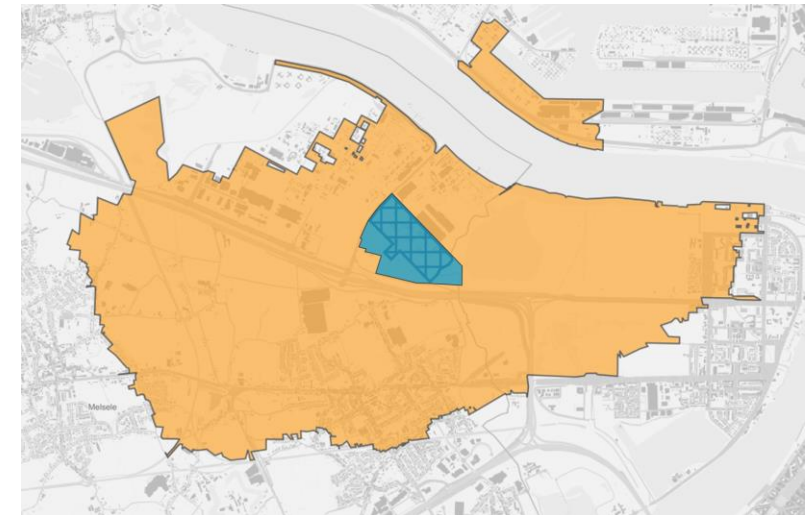

— Vastgestelde perimeter waarbinnen 3M Belgium een saneringsplicht heeft

— BSP 3M site Zwijndrecht

Sanering zone nieuwe waterzuiveringsinstallatie

[Terug naar het overzicht](#)

Wanneer te verwachten: In uitvoering sinds Q4 2024


- **Onderdeel van BSP:** Eerste gefaseerde BSP on site (2008); kleine wijziging op het BSP van 2008 (2022); en BSP Kefalonia WZI (2025)
- **Locatie:** 3M site in Zwijndrecht
- **Doel:**
 - Het voorbereiden van de zone waar een nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal komen. Dankzij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal de sanering van grondwater op de site opgeschaald kunnen worden tot 1000 m³ per dag. Op aanvraag van natuurorganisaties kan het gezuiverd water ook geleverd worden aan Blokkersdijk om uitdroging tegen te gaan.
- **Belangrijke momenten:**
 - Bouw tijdelijke opslagplaats voor de gronden
 - Bodemsanering tot 2 meter diepte
 - Start bouw waterzuiveringsinstallatie

Status:

Voltooid

Voltooid

In voorbereiding

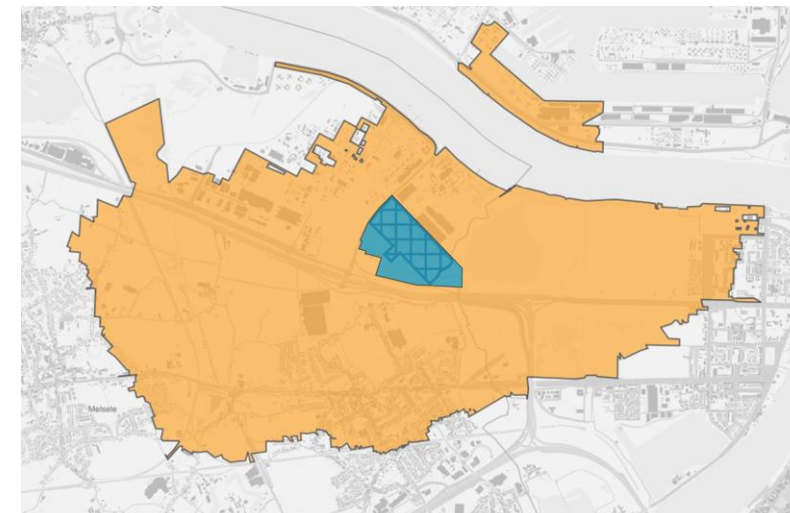

— Vastgestelde perimeter waarbinnen 3M
Belgium een saneringsplicht heeft

— BSP 3M site Zwijndrecht

Sanering zone 1A

[Terug naar het overzicht](#)

Wanneer te verwachten: In uitvoering sinds Q2 2023

- **Onderdeel van BSP:** BSP zone 1A (2022)
- **Locatie:** Het gebied tussen E34, Polderstraat en Graanmolenstraat
- **Doel:**
 - Het uitvoeren van een leeflaagsanering (bovenste 70 cm) in de onverharde gedeeltes van de tuinen. Dit zal gepaard gaan met koppelkansen zoals besproken met het multidisciplinair team.
- **Belangrijke momenten:**
 - Opstellen draaiboek
 - Sanering terrein Bosman
 - Bouw tijdelijke brug
 - Bouw tijdelijke opslagplaats (TOP)
 - Sanering eerste cluster (cluster 13)

Status:


Voltooid

Voltooid

In voorbereiding

In voorbereiding

Te starten

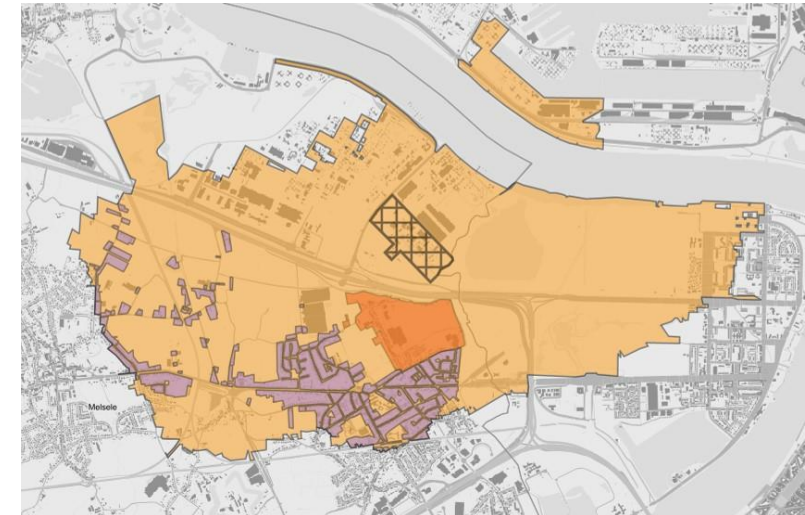

Vastgestelde perimeter waarbinnen 3M
Belgium een saneringsplicht heeft

BSP Zone 1A

BSP Verdere woongebied

Sanering verdere woongebied

[Terug naar het overzicht](#)

Wanneer te verwachten: In uitvoering sinds Q2 2023

- **Onderdeel van BSP:** Voorzorgsmaatregel (2023); BSP verdere woongebied (2024)
- **Locatie:** Het verdere woongebied binnen de vastgestelde perimeter
- **Doel:**
 - Het saneren van moestuinen en kippenrennen in het verdere woongebied. Om alles zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren zullen bewoners gevraagd worden of zij een moestuin of kippenren hebben die gesaneerd dient te worden, of toekomstig een moestuin willen hebben.
- **Belangrijke momenten:**
 - Voorzorgsmaatregelen
 - Oprichten multidisciplinair team
 - Opstellen draaiboek
 - Bevraging bewoners
- **Uitdagingen:**
 - Een hoge responsgraad bereiken met de bewonersbevraging


Status:

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In voorbereiding

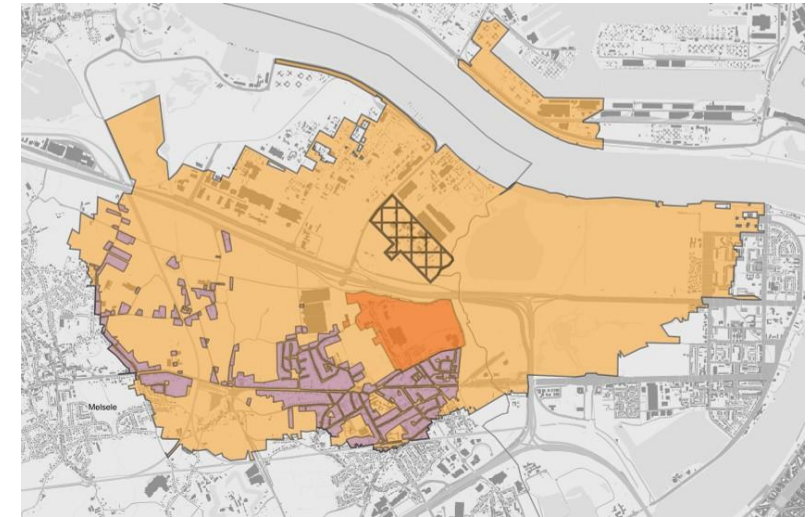

Vastgestelde perimeter waarbinnen 3M
Belgium een saneringsplicht heeft

BSP Zone 1A

BSP Verdere woongebied


Sanering sediment Palingbeek

[Terug naar het overzicht](#)

Wanneer te verwachten: Start uitvoering februari 2025

- **Onderdeel van BSP:** BSP slibverwijdering Palingbeek (2024)
- **Locatie:** De Palingbeek, ten noorden van de E34 en rechts van Blokkersdijk
- **Doel:**
 - Het verwijderen van gecontamineerd slib in de Palingbeek.
- **Belangrijke momenten:**
 - Verwijderen van slib
- **Uitdagingen:**
 - Tijdens deze werken dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen (maart – juli)
 - Hinder voor de fietsers zo veel mogelijk beperken

Status:
In voorbereiding

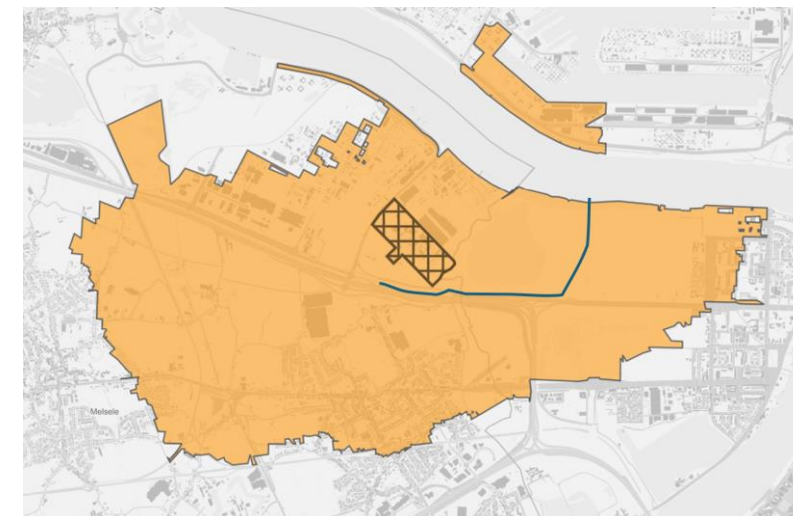

— Vastgestelde perimeter waarbinnen 3M
Belgium een saneringsplicht heeft

— Palingbeek
